AFRICA CLIMATE CHANGE FUND

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

FONDS POUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN AFRIQUE

RAPPORT ANNUEL 2016





TABLE DES MATIÈRES

ACRONYMES 3

AVANT-PROPOS 5

I. INTRODUCTION 6

LES JALONS DE L'ANNÉE 2016 6

LES MOMENTS FORTS DE 2016 7

II. ÉTAT D'AVANCEMENT 8

JALONS DES PROJETS 8

ÉVALUATION ET APPROBATION DES PROPOSITION DE PROJETS 9

EXÉCUTION DES PROJETS 10

COORDINATION DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION AU FINANCEMENT CLIMATIQUE 12

SENSIBILISAITON ET COMMUNICATION 13

MOBILISATION DES RESSOURCES ET CONVERSION EN UN FONDS MULTI DONATEURS 14

V. GESTION FINANCIÈRE 15

ÉTAT FINANCIER RÉCAPITULATIF 15

LEÇONS APPRISES 16

V. PERSPECTIVES POUR 2017 18

PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR 2017 18

VI. ANNEXES 20

ANNEXE 1: STATUT DES PROJETS APPROUVÉS 20





ACRONYMES

AEDD	Agence pour l'environnement et le développement durable
BAD	Banque africaine de développement
CA	Conseil d'administration
PACC	Plan d'action sur le changement climatique de la BAD
COP22	22e Conférence des Parties à la CCNUCC
CS	Comité de surveillance
CT	Comité technique
CEDEAO	Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
FA	Fonds d'adaptation
FCCA	Fonds pour les changements climatiques en Afrique
FVC	Fonds vert pour le climat
MDTF	Fonds d'affectation spéciale multidonateurs
NDC	Contributions nationales déterminées
ONG	Organisation non gouvernementale
PECG	Département du changement climatique et de la croissance verte
PECG1	Division du financement climatique, PECG
RCM	Mécanisme de coordination des activités de préparation
RMC	Pays membres régionaux
SADC	Communauté de développement de l'Afrique australe
CCNUCC	Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
CND	Contributions nationales déterminées

“Le FCCA soutient de nombreux pays africains dans le renforcement de leurs capacités pour leur permettre d’accéder à des fonds climatiques internationauxs”



Dr. Anthony O. NYONG

Directeur du département changement climatique et de la croissance verte (PECG)

Banque africaine de développement

Le continent africain est celui qui contribue le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, néanmoins il est l'un des plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Les pays africains ont énoncé des engagements ambitieux en matière d'adaptation et d'atténuation du changement climatique dans leurs contributions nationales déterminées (CND), dont beaucoup nécessiteront des financements importants et d'autres formes de soutien pour être réalisés. Pourtant, l'Afrique reçoit actuellement moins de trois pour cent du total des flux de financements climatiques, bien en deçà de ses besoins estimés.

Pour faire face à ces défis, la Banque africaine de développement (BAD) a créé le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA) en avril 2014 dans le but d'aider les pays africains à renforcer leur résilience aux effets négatifs du changement climatique et soutenir la transition vers une croissance durable et à faible émission de carbone. Au cours des trois années qui ont suivi sa création, le FCCA s'est établi comme un mécanisme de financement climatique pour appuyer les activités de préparation et les projets à petite échelle sur tout le continent africain. Le Fonds a une visibilité croissante et un pipeline de projets dont la valeur excède les financements disponibles actuellement, et la demande en ressources est importante et en forte progression. Le Fonds a attiré de nouveaux donateurs, ce qui lui a permis de devenir un fonds fiduciaire multidonateurs.

En tant que fonds fiduciaire multidonateurs, le FCCA est bien positionné pour contribuer à atteindre l'objectif de la Banque de tripler son financement climatique pour atteindre 5 milliards de dollars EU par an d'ici 2020, ainsi que les objectifs énoncés dans le Plan d'action sur le changement climatique (PACC) 2016-2020 et la Stratégie 2013-2022 de la Banque. En outre, le Fonds aidera la Banque à intégrer les aspects de croissance verte et de résilience climatique dans la réalisation de ses cinq grandes priorités.

Dans les années à venir, le FCCA aspire à attirer de nouveaux donateurs et à accroître son soutien en financement climatique pour permettre aux pays africains d'atteindre les objectifs ambitieux énoncés dans leurs contributions nationales déterminées.



Dr. Anthony Nyong


I. INTRODUCTION

L'Accord de Paris, adopté à la 21e Conférence des Parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), établit clairement la nécessité d'accroître et d'orienter les investissements vers une trajectoire de croissance à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique, et d'assurer des financements adéquats à l'adaptation et au renforcement de la résilience. Les pays africains ont défini des aspirations audacieuses pour bâtir des économies résilientes au changement climatique et à faible émission de carbone dans leurs contributions nationales déterminées (NDC), et ont énoncé des besoins en financements considérables pour atteindre ces objectifs.

Le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA), créé en 2014 grâce à une contribution initiale de 4,725 millions d'euros du gouvernement allemand, joue un rôle pivot dans le soutien aux pays membres africains pour atteindre ces objectifs. Le Fonds a fait de bons progrès depuis sa création et gagné en reconnaissance en tant qu'initiative de financement climatique importante. Le FCCA a pu obtenir un engagement financier supplémentaire de 4,7 millions d'euros du gouvernement italien fin 2015 et un engagement de 2 millions d'euros du gouvernement de la Flandre en Belgique en 2016. Ces nouveaux financements portent le total des contributions à plus de 11,4 millions d'euros et ont permis au FCCA d'engager sa conversion en un fonds multidonateurs, et donc d'accroître ses opérations et d'assurer ses engagements.

La conversion du FCCA en un fonds fiduciaire multidonateurs est arrivé à point nommé, la COP21 et les discussions subséquentes qui se sont déroulées à Marrakech en novembre 2016 ayant relevé le niveau d'ambition en matière de lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. De plus, la Banque s'est fixé l'objectif ambitieux de tripler son propre financement climatique pour le porter à 5 milliards de dollars EU par an d'ici 2020. Faire avancer le processus de conversion, y compris faire le bilan des leçons apprises quand le Fonds était bilatéral, a été l'axe principal des activités du Fonds en 2016. Pour ce qui est de l'avenir, le FCCA est bien placé pour aider les pays africains à renforcer leur accès au financement climatique, soutenir les institutions et les initiatives novatrices qui ne bénéficient d'aucun soutien, et faciliter de nouveaux partenariats.

LES JALONS DE 2016 DU FCCA

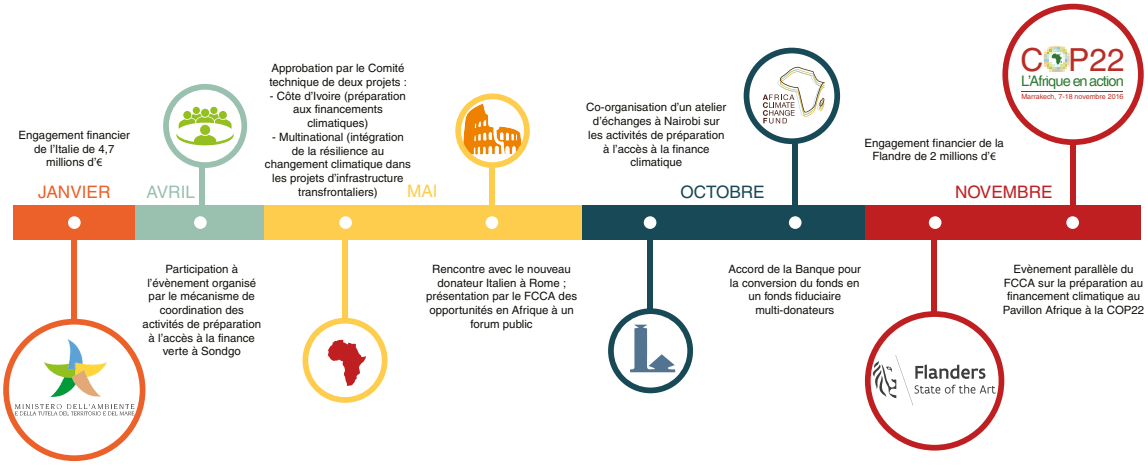

LES MOMENTS FORTS DE 2016

- Le FCCA a approuvé deux nouvelles subventions totalisant 0,78 million $ EU. L'un des projets renforcera la capacité de la Côte d'Ivoire à accéder aux financements climatiques, tandis que le second intégrera la résilience climatique dans deux projets transfrontaliers au Togo et au Bénin, ainsi qu'en Zambie et au Zimbabwe.
- Sept projets approuvés par le FCCA sont passés à la phase d'exécution, les lettres d'accord entre la Banque et les bénéficiaires ont été signées pour cinq des projets (Mali, Kenya, Swaziland, Cabo Verde et Côte d'Ivoire), des missions de lancement ont été menées dans trois pays, et le premier décaissement a été versé aux deux projets exécutés par la Banque.
- La conversion du FCCA en un fonds fiduciaire multidonateurs a débuté en janvier 2016 suite à l'engagement de 4,7 millions d'euros du gouvernement italien. Cette conversion a été faite en suivant le nouveau document légal de la Banque pour les fonds multidonateurs approuvé par la haute direction de la Banque en octobre 2016 et par le Conseil d'administration de la Banque début 2017.
- Le FCCA a attiré un nouveau donateur : le gouvernement de la Flandre, en Belgique, avec un engagement de 2 millions d'euros fin 2016.
- Le FCCA a organisé plusieurs évènements de sensibilisation et d'apprentissage sur l'accès direct au financement climatique pour les institutions africaines en partenariat avec l'Institut mondial des ressources, le Centre de suivi écologique du Sénégal, l'Autorité nationale de gestion de l'environnement du Kenya et d'autres partenaires.

BREF APERÇU DE 2016

Conversion d'un fonds bilatéral en un fonds multidonateur suite à un engagement du gouvernement italien de 4,7 millions d'euros

En 2016, le FCCA a approuvé deux nouvelles subventions totalisant 0m78 million de dollars, portant le montant total des subventions à 3,31 millions de dollars

8 projets du FCCA : Kenya, Mali, Cabo Verde, Swaziland, Cote d'Ivoire, Tanzanie (Zanzibar) et 2 multinationaux


Le FCCA a co-organisé plusieurs évènements de sensibilisation et d'apprentissage sur l'accès direct au financement climatique

Nouveau donateur : le gouvernement de la Flandre, en Belgique, a engagé 2 millions d'euros fin 2016

11,4 millions d'euros consacrés à la préparation aux changements climatiques et a l'accès au financement climatiques

II. ÉTAT D'AVANCEMENT

JALONS DES PROJETS

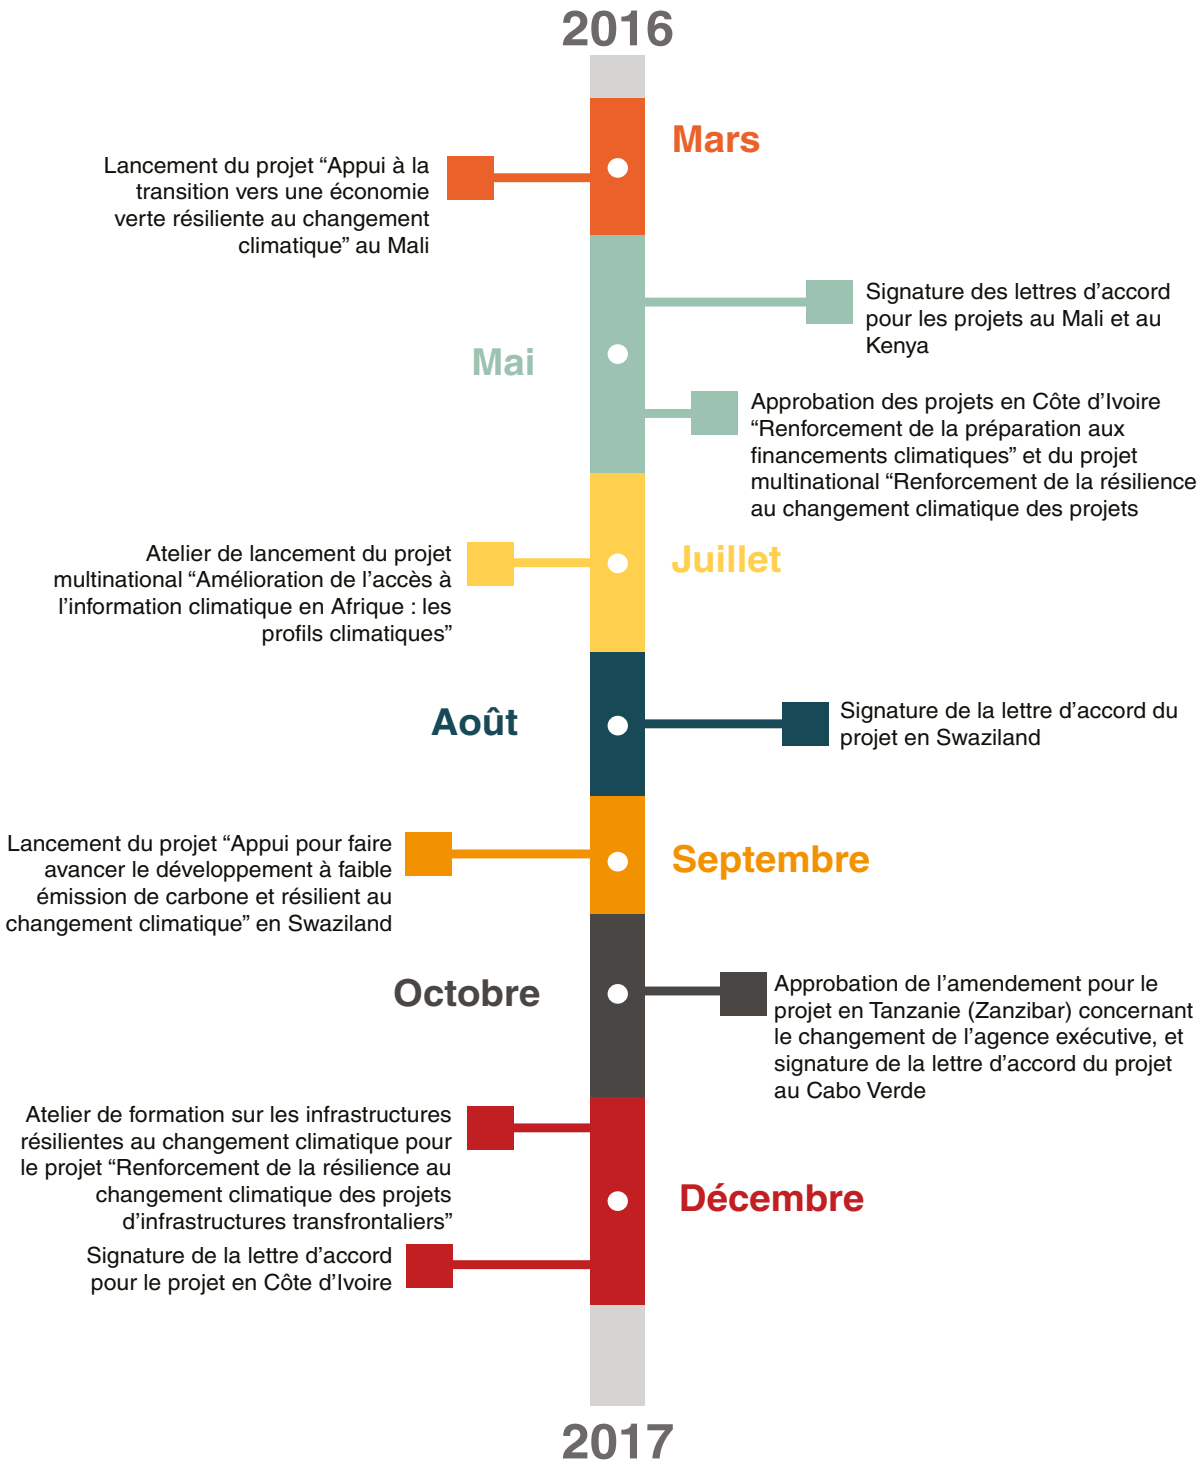


ÉVALUATION ET APPROBATION DES PROPOSITIONS DE PROJETS

Deux projets ont été approuvés par le comité technique du FCCA en mai 2016. Une subvention de 429 422 $ EU appuiera la Côte d'Ivoire, un pays très vulnérable au changement climatique, pour renforcer sa capacité à mobiliser des ressources internationales pour les besoins d'un développement résilient au changement climatique. Le projet élaborera une proposition complète à soumettre au Fonds d'adaptation (FA) et une note conceptuelle détaillée au Fonds vert pour le climat (FVC). Le projet comprendra des formations au profit d'experts nationaux en matière de changement climatique sur la conception et la gestion de projets, et la mobilisation de ressources pour le financement climatique. Enfin, le projet entreprendra une étude visant à identifier une entité nationale capable d'obtenir l'accréditation pour mettre en œuvre des projets FVC.

Une deuxième subvention de 346 600 $ EU se focalisera sur l'amélioration des connaissances et des capacités, et la facilitation des partenariats pour des projets d'infrastructure africains qui prennent en compte le changement climatique, ainsi que la promotion du développement d'infrastructure résiliente au changement climatique dans deux projets transfrontaliers. La section Togo-Bénin du projet d'infrastructure du corridor routier côtier Abidjan-Lagos, vulnérable aux impacts du changement climatique, en particulier les inondations, l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière, sera résiliente aux impacts négatifs du changement climatique. De plus, le projet intégrera la résilience aux changements climatiques dans le projet hydroélectrique de la Gorge de Batoka, un projet stratégiquement important pour la Zambie et le Zimbabwe qui fournira une électricité propre et fiable. La subvention renforcera la capacité de 100 décideurs politiques de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en matière d'intégration de mesures résilientes sur les risques climatiques dans les projets du secteur énergétique et du transport.

Un certain nombre de propositions retenues lors du premier appel à projet demeurent dans le pipeline. L'évaluation de plusieurs de ces projets est en cours, mais d'autres sont en stand-by pour diverses raisons et seront réévaluées au début de l'année 2017, une fois la conversion en un fonds multidonateurs finalisée.

BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES ET ACTIVITÉS

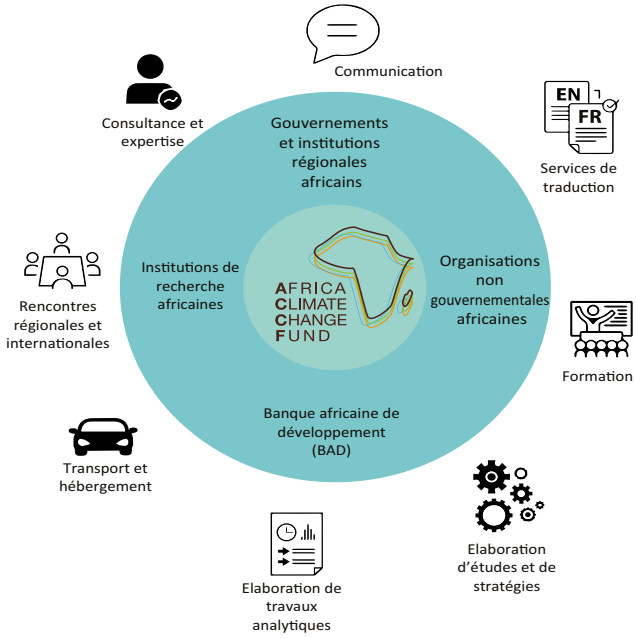

EXÉCUTION DES PROJETS

Sept projets approuvés par le FCCA sont passés à la phase d'exécution, les lettres d'accord entre la Banque et les bénéficiaires ont été signées pour cinq des projets exécutés en externe (Mali, Kenya, Swaziland, Cabo Verde et Côte d'Ivoire) et des missions de lancement ont été menées dans trois pays (Mali, Swaziland et Kenya). Des missions de lancement en Côte d'Ivoire, à Zanzibar et à Cabo Verde sont prévues début 2017. Le premier décaissement des fonds du FCCA pour des activités de projet a été réalisé pour deux projets exécutés par la Banque. Les projets exécutés par la Banque ont permis de réaliser un premier décaissement plus rapidement que les projets exécutés en externe car le processus de signature de la lettre d'accord avec les bénéficiaires externes prend plusieurs mois et, dans plusieurs cas, a enregistré des retards pour diverses raisons internes et externes. L'annexe 1 fournit plus de détails sur l'état de chacun des projets approuvés par le FCCA.

Nom du projet	Pays	Status	Montant (US $)
NATIONAL			
Appui à la transition vers une économie verte résiliente au changement climatique	Mali		404 000
Appui pour faire avancer le développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique	Swaziland		305 000
Renforcement des capacités nationales en matière d'intégration de la résilience au changement climatique	Tanzanie / Zanzibar		361 515
Avancement des projets d'énergie propre	Cap Vert		495 037
Avancement du programme de croissance verte	Kenya		550 603
Renforcement de la préparation aux financements climatiques	Cote d'Ivoire		429 422
MULTINATIONAL			
Amélioration de l'accès à l'information climatique en Afrique	Multinational		420 000
Renforcement de la réslience aux changements climatiques des projets d'infrastructure transfrontaliers	Multinational		346 600

Attente de signature de la lettre d'accord

Lettre d'accord signée et démarche d'acquisition entamée

Activités du projet en cours

PROJETS FCCA



III. COORDINATION DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION AU FINANCEMENT CLIMATIQUE

La BAD, par l'entremise du FCCA, est membre du Mécanisme de coordination des activités de préparation (RCM), qui a été créé par le Secrétariat du FVC et qui comprend toutes les principales institutions qui appuient les activités de préparation à l'accès à la finance climatique. Grâce à ce mécanisme, le Secrétariat du FCCA collabore régulièrement avec le Secrétariat du FVC et d'autres partenaires actifs dans le domaine de la préparation afin d'assurer la complémentarité et la cohérence de leurs activités, tant au niveau des pays où le FCCA a des projets, qu'au niveau régional.

Au cours des réunions du RCM en avril à Songdo, en Corée, et en novembre à Marrakech, au Maroc, les membres ont discuté de la manière d'œuvrer de manière collaborative à appuyer les activités de préparation dans les pays en développement et ont identifié les points forts de chaque organisation. La BAD a été estimée bien placée pour appuyer l'organisation de rencontres des parties prenantes africaines ainsi que pour soutenir les initiatives de formation visant à renforcer la capacité africaine pour un accès direct au financement climatique, en mettant l'accent sur l'accréditation et l'élaboration de projets pour le FVC.

En octobre 2016, le FCCA a collaboré avec l'Institut des ressources mondiales (WRI), l'Autorité nationale de gestion de l'environnement du Kenya et un certain nombre d'autres acteurs pour organiser un évènement à Nairobi pour que les institutions africaines échangent des leçons et des expériences sur l'accès direct et le développement de projets pour le FVC. Le FCCA a pris à sa charge la venue de plusieurs représentants d'agences d'exécution bénéficiant de subventions du FCCA pour assister à cet événement afin d'échanger et d'apprendre d'un certain nombre d'entités accréditées par le FVC.

Au cours de cet évènement, les parties prenantes ont proposé d'organiser une discussion de suivi en marge de la COP22 à Marrakech dans le but d'explorer davantage l'opportunité de créer une communauté de pratique et une plateforme pour un apprentissage Sud-Sud sur l'accès direct. Pour cette raison, le FCCA, en collaboration avec l'Institut des ressources mondiales (WRI), le Centre de suivi écologique du Sénégal, l'Autorité nationale de gestion de l'environnement du Kenya ont réuni des parties prenantes (y compris les entités nationales de mise en œuvre du FVC et du Fonds d'adaptation, les secrétariats de Fonds et des organisations travaillant sur la thématique de la préparation) lors d'un atelier d'une journée à Marrakech en novembre. Au cours de cet atelier, les participants ont convenu de créer un comité pour définir davantage la communauté de pratique et élaborer une note conceptuelle.

IV. SENSIBILISAITON ET COMMUNICATION

En 2016, le secrétariat a produit un certain nombre d'outils de communication stratégiques et a mené un certain nombre d'évènements visant à sensibiliser au FCCA des bénéficiaires africains potentiels ainsi que des bailleurs de fonds, des partenaires, des médias et le grand public. Ces produits incluaient :

- Une série de communiqués de presse apportant des mises à jour sur les dernières activités du FCCA
- Une brochure de 8 pages mise à jour, intitulée "Aider l'Afrique à accéder aux financements climatiques", décrivant la mission du FCCA, les bénéficiaires éligibles et les réalisations des projets. Cette dernière est disponible en ligne, en anglais et en français, et a été diffusée lors d'évènements externes.
- Un déjeuner de travail avec une séance de présentation et une session de question-réponse, sur le FCCA pour le staff de la banque en avril 2016.
- Une présentation et une table ronde sur le FCCA organisé à Rome (Italie), en mai 2016, pour sensibiliser les parties prenantes
- Une série de discussions et de rencontres, en marge de la COP22 à Marrakech, visant à sensibiliser les pays africains et les bailleurs de fonds potentiels au FCCA et à explorer des domaines de collaboration avec des partenaires existants et potentiels.

A l'occasion de la COP22 à Marrakech, le FCCA a collaboré avec l'Institut des ressources mondiales (WRI) et le Centre de suivi écologique du Sénégal pour organiser une manifestation publique au Pavillon Afrique sur le rôle de l'accès direct au financement climatique pour promouvoir un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique en Afrique. L'évènement a été animé par un panel d'experts prestigieux et a été bien accueilli par un public important et engagé.




COP22 à Marrakech, conférence "Rôle d el'Afrique sur le rôle de l'accès direct au financement climatique"

V. MOBILISATION DES RESSOURCES ET CONVERSION EN UN FONDS MULTIDONATEURS

Le FCCA a pu obtenir un engagement financier supplémentaire de 4,7 millions d'euros du gouvernement italien fin 2015. Cette contribution a permis au FCCA d'initier sa conversion en un fonds fiduciaire multidonateurs (MDTF en anglais), tel que prévu dans sa structure de gouvernance de fonds bilatéral. Cette conversion permettra au FCCA d'intensifier ses opérations et à sécuriser ses engagements. Elle est également une opportunité de tirer des leçons des expériences du Fonds fiduciaire bilatéral et de relever certains défis abordés dans le rapport annuel 2015, y compris la nécessité de clarifier les procédures opérationnelles en accord avec les objectifs du Fonds et les critères d'éligibilité.

Le processus de conversion a été lancé en janvier 2016 avec des consultations internes auprès de divers départements de la BAD. Une note conceptuelle sur la conversion du FCCA en MDTF a été approuvée par le Comité permanent sur les partenariats de la Banque en juillet 2016 et l'ébauche du document légal relatif à cette conversion a été approuvé par la haute direction de la Banque et partagé avec les bailleurs de fonds en octobre 2016. Les négociations entre la Banque et les bailleurs de fonds ont commencé en novembre 2016 et étaient en voie d'achèvement à la fin de l'année.

En novembre 2016, le gouvernement de la Flandre, en Belgique, a accepté de rejoindre le FCCA avec une contribution de 2 millions d'euros, portant le total des contributions du FCCA à plus de 11,4 millions d'euros. Cet engagement témoigne de la confiance accordée au travail fourni par le FCCA pour aider les pays africains à mobiliser des financements climatiques à la hauteur et à lutter contre la vulnérabilité aux effets du changement climatique. La conversion du FCCA en un fonds fiduciaire multidonateurs a été approuvée par le Conseil d'administration de la Banque au début de l'année 2017 et un nouvel accord multidonateurs a été signé entre la Banque et les trois bailleurs de fonds.

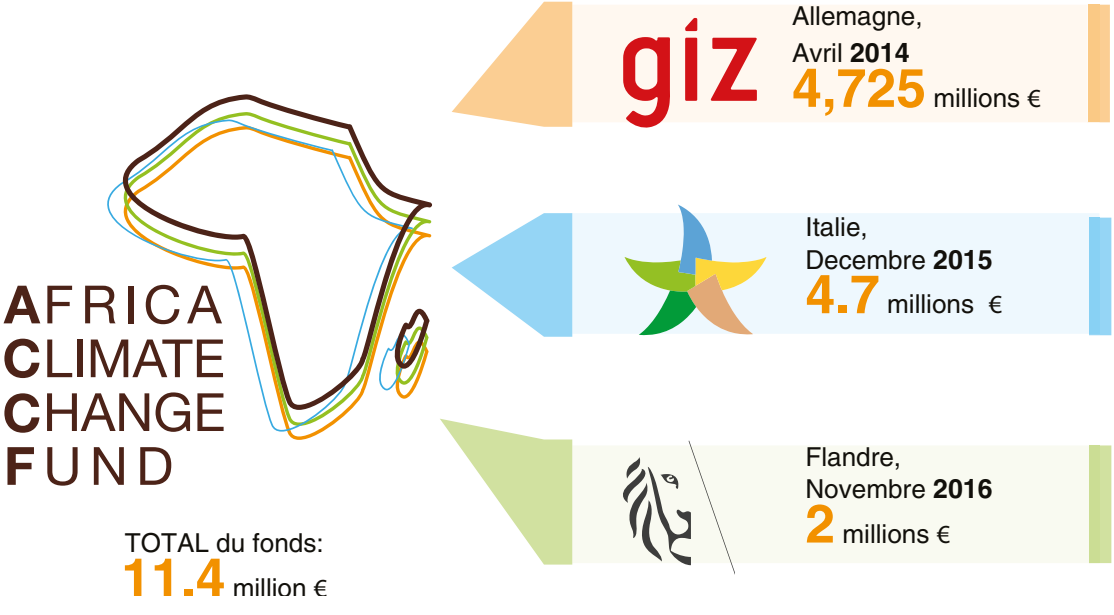

VI. GESTION FINANCIÈRE

ÉTAT FINANCIER RÉCAPITULATIF

A la fin de 2016, le FCCA a engagé 3,3 millions $ EU à la réalisation de projets, dont 0,78 million $ EU de nouveaux engagements, avec un décaissement total pour les projets de 108 644 $ EU. Les décaissements au titre des activités administratives du Secrétariat se sont élevés à 270 499 $ EU. En se fondant sur l'hypothèse que le montant total affecté aux frais généraux est engagé pour toute la durée de vie du Fonds, on estime que le FCCA disposera, pour l'année à venir, de 2,1 millions $ EU pour les engagements au profit des projets et de 5,8 millions $ EU pour les décaissements.

ÉTAT FINANCIER RÉCAPITULATIF (EN $ EU AU 31/12/2016)

Contributions	Montant ($ EU)
Contributions des bailleurs de fonds	**6 191 640**
Intérêts échus	**27 937**
Total des ressources	**6 219 577**

Utilisation des ressources	Montant alloué ($ EU)	Montant décaissé ($ EU)
Engagement au titre des projets	3 311 577	108 644
Frais généraux		
Dépenses administratives	471 745	270 498
Audit annuel	26 208	4 130
Frais de gestion	309 582	14 833
Total	**4 119 112**	**398 105**

Engagements cumulés ($ EU)	4 119 112
Montant disponible pour de nouveaux engagements	2 100 465
Décaissements cumulés	398 105
Montant disponible pour les décaissements	5 821 472

VII. LEÇONS APPRISES

Le nombre d'approbations et de décaissements réalisés au profit des projets a été inférieur aux prévisions initiales du plan de travail de 2016, estimées à 6 nouveaux projets approuvés, 2,86 millions $ EU d'engagements et 2 millions $ EU de décaissements à la fin de 2016. Le Fonds a tiré quelques leçons pertinentes au cours de ses opérations et identifié quelques domaines d'amélioration, qui contribueront à assurer son succès futur et la rapidité de ses opérations. Certaines de ces leçons apprises sont décrites ci-dessous.

Renforcer la structure organisationnelle de la Banque pour fournir du financement climatiques

L'écart entre les cibles et les réalisations s'explique en partie par le fait que la Banque avait engagé un processus de restructuration en 2016, ce qui a considérablement ralenti la conversion du FCCA en un fonds fiduciaire multidonateurs. Compte tenu de la capacité limitée du personnel du secrétariat du FCCA, la priorité a été accordée à l'achèvement du processus de conversion et à l'avancement de la mise en œuvre des projets approuvés, plutôt qu'à l'approbation de nouveaux projets. L'évaluation des projets en cours a été mise en attente jusqu'à l'achèvement de la conversion en un MDTF.

La nouvelle structure organisationnelle met davantage l'accent sur le changement climatique, conformément à l'engagement récent de la Banque d'accroître son propre financement climatique à 5 milliards $ EU par an d'ici 2020, en créant un nouveau département du changement climatique et de la croissance verte qui abrite le FCCA. Malgré les retards rencontrés, cette nouvelle structure contribuera à assurer un soutien interne plus fort de la Banque aux opérations du FCCA, ce qui garantira le succès du prochain appel à propositions.

Renforcer l'exécution des projets

Les délais d'avancement des projets pour atteindre l'étape du premier décaissement, en particulier pour la signature de la lettre d'accord avec les bénéficiaires externes, et pour compléter le processus d'acquisition, ont été plus longs que prévu. De plus, identifier des référants internes pour superviser les petits projets et les faire avancer dans le processus du cycle de projet de la Banque, est resté une étape difficile pour le FCCA. Afin de relever en partie ces défis, le Secrétariat a augmenté sa capacité opérationnelle en recrutant, fin 2016, un chargé de programme à temps plein afin d'apporter un appui supplémentaire aux gestionnaires internes et aux bénéficiaires, pour faire avancer les projets dans la phase de mise en œuvre. Cependant, cela augmente les coûts administratifs du Secrétariat, soulignant un problème commun aux petits fonds fiduciaires tels que le FCCA, les coûts administratifs sont souvent relativement élevés en proportion des engagements totaux. Le FCCA continuera à mettre l'accent sur l'appui à l'exécution des projets et on s'attend à ce que les coûts administratifs en proportion des contributions globales diminuent à mesure que la taille du fonds augmente.

La nécessité d'une mise en œuvre simplifiée pour les petits projets

En plus de renforcer la capacité du Secrétariat pour que ce dernier puisse appuyer l'exécution des projets, il est nécessaire de simplifier et d'accélérer les processus opérationnels tout au long du cycle du projet afin d'assurer des décaissements plus opportuns. Cela reste un challenge, car les règles et les procédures existantes de la Banque sont conçues pour des projets de grande envergure et ne sont pas toujours bien adaptées aux petites opérations financées par des fonds fiduciaires tels que le FCCA. Afin de relever ce défi, l'instrument multidonateur révisé FCCA et les lignes directrices opérationnelles proposeront de rationnaliser et de simplifier certaines étapes du cycle de projet pour permettre une mise en œuvre plus efficace des projets approuvés, adaptée à la taille des projets, sans compromettre la qualité et l'intégrité fiduciaire des opérations du FCCA. Ce défi n'est pas particulier au FCCA et pourrait être envisagé pour tous les petits projets à l'échelle de la Banque.



VIII. PERSPECTIVES POUR 2017

Le FCCA a réalisé des progrès notables en 2016, notamment avec l'achèvement de la conversion du Fonds en un fonds fiduciaire multidonateurs, 8 projets à divers niveaux de mise en œuvre et un nouvel engagement financier de 2 millions d'euros assuré. Dans l'avenir, le FCCA se concentrera sur l'opérationnalisation du nouveau Fonds multidonateurs, l'exécution des projets approuvés et l'attraction de nouvelles et innovantes propositions de financement.

PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR 2017

Renforcement du Fonds en un fonds fiduciaire multidonateurs

Le nouveau Fonds fiduciaire multidonateurs est approuvé en mars 2017 et un nouvel accord juridique est signé entre la Banque et les gouvernements d'Allemagne, d'Italie et de la Flandre.

Opérationnalisation du Fonds en un fonds fiduciaire multidonateurs

Une fois la conversion terminée, le FCCA devra opérationnaliser le nouveau fonds, y compris la mise en place d'un comité technique et d'un comité de surveillance, l'approbation des nouvelles lignes directrices opérationnelles, un cadre de gestion des résultats et un programme de travail ainsi qu'un budget annuel.

Lancement d'un nouvel appel à propositions

Le FCCA envisage de lancer un nouvel appel à propositions d'ici le premier semestre 2017, une fois que la conversion du Fonds sera opérationnalisée.

Consolidation de l'équipe

Le Secrétariat du FCCA cherchera à augmenter ses effectifs pour améliorer son processus d'évaluation, gérer le nouvel appel à propositions et superviser la phase de mise en œuvre du projet.

Mobilisation des ressources

Compte tenu de la forte demande en ressources du FCCA, la Banque continuera de s'engager auprès de bailleurs de fonds potentiels dans le but de garantir un engagement financier supplémentaire.

Coordination des activités de préparation au financement climatique

Le Secrétariat du FCCA continuera à travailler étroitement avec le Secrétariat du FVC et d'autres bailleurs de fonds dans le domaine de la préparation au financement climatique. Le FCCA vise l'organisation d'au moins un évènement de coordination sue le thème de la préparation afin de réunir les bénéficiaires et faciliter le dialogue.



ANNEXE 1: STATUT DES PROJETS APPROUVÉS

Titre	**Appui pour faire avancer le développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique**
Pays	Swaziland
Agence d'exécution	Ministère du Tourisme et des Affaires environnementales
Montant alloué par le FCCA	305 000 $ EU
Objectifs principaux	Le projet vise à améliorer la préparation pour l'investissement dans le développe-ment à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. Il éva-luera et hiérarchisera les actions d'adaptation et d'atténuation, et élaborera des notes conceptuelles et des propositions à soumettre aux sources de financement climatique telles que le FVC. De plus, il fournira une formation aux principaux gestionnaires et coordinateurs de projet de différentes institutions sur le dévelop-pement et la gestion de projets.
Status	La lettre d'accord a été signée en août 2016 et le compte spécial du projet a été ouvert. La mission de lancement du projet a eu lieu en septembre 2016 et le processus de passation de marchés a été initié. Le premier décaissement devrait être fait début 2017.

Titre	**Renforcement des capacités nationales en matière d'intégration de la résilience au changement climatique**
Pays	Zanzibar, Tanzanie
Agence d'exécution	Ministère des Terres, de l'Eau, de l'Energie et de l'Environnement, Zanzibar
Montant alloué par le FCCA	361 515 $ EU
Objectifs principaux	Le projet vise à renforcer les capacités nationales en matière de changement climatique et à intégrer la résilience climatique dans la planification du développement de quatre secteurs essentiels : l'agriculture, la pêche, l'infrastructure et le tourisme, aux niveaux nationaux, local et municipal. Il développera davantage de notes conceptuelles de projets afin de mobiliser des financements climatiques supplémentaires pour renforcer la résilience de ces secteurs.
Status	Le Comité technique a approuvé l'amendement du document du projet en octobre 2016 pour changer d'agence d'exécution suite à un remaniement dans le gouvernement de Zanzibar. La signature de la lettre d'accord est attendue au début de 2017.

Titre	**Appui à la transition vers une économie verte résiliente au changement climatique**
Pays	Mali
Agence d'exécution	Agence de l'Environnement et du Développement durable du Mali
Montant alloué par le FCCA	404 000 $ EU
Objectifs principaux	Le projet appuiera le gouvernement pour l'élaboration de deux pro-grammes stratégiques pour une économie verte, résiliente au changement climatique : l'un dans les énergies renouvelables et l'autre axé sur l'adaptation dans le secteur agricole. Il aidera en outre le Mali à concevoir une stratégie pour le financement de sa transition vers une croissance verte résiliente au changement climatique et à attirer l'investissement du secteur privé dans cette transition.
Status	La mission de lancement du projet a eu lieu en mars 2016. La lettre d'accord a été signée en mai. Le processus de passation de marchés pour le recrutement d'une firme internationale qui sera chargée de la conduite des activités principales du projet est en cours, et le premier décaissement devrait se faire début 2017.

Titre	**Amélioration de l'accès à l'information climatique en Afrique : profils pays sur le changement climatique**
Pays	Multinational
Agence d'exécution	BAD – Département pour le changement climatique et la croissance verte
Montant alloué par le FCCA	420 000 $ EU
Objectifs principaux	Le projet va permettre la production d'informations à jour sur les vulnérabilités au changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et les opportunités d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets pour 25 pays africains. Le projet permettra en outre le développement d'une plateforme mondiale pour le partage et l'actualisation des informations contenues dans les profils et de fournir une formation aux membres du personnel des départements de l'économie et de la planification dans les pays africains.
Status	Le contrat pour services de consultance a été attribué à l'Initiative Africa Climate and Development à l'Université de Cape Town en juin 2016. Le consultant a mené une mission préparatoire à la Banque en juillet 2016 et a entamé l'élaboration des profils. Un montant de 31 330 $ EU (7 % du montant du projet) a été décaissé à la fin de 2016.

Titre	**Avancement des projets d'énergie propre**
Pays	Cabo Verde
Agence d'exécution	Direction nationale de l'Environnement
Montant alloué par le FCCA	495 037 $ EU
Objectifs principaux	Le projet vise à renforcer la capacité du Cabo Verde à accéder aux financements climatiques pour soutenir ses objectifs de développement résilient au changement climatique. Le projet appuiera le développement de mesures d'atténuation appropriées au niveau national (NAMA) pour les secteurs stratégiques de l'énergie et des déchets ainsi que la mobilisation de financements climatiques pour la mise en œuvre des NAMA.
Status	La lettre d'accord a été signée en octobre 2016. L'ouverture d'un compte bancaire spécial, le lancement du processus de passation de marchés et une mission de démarrage de projet devront avoir lieu début 2017.

Titre	**Avancement du programme de croissance verte**
Pays	Kenya
Agence d'exécution	Fonds national pour l'environnement du Kenya
Montant alloué par le FCCA	550 603 $ EU
Objectifs principaux	Le projet appuiera le Fonds national pour l'environnement du Kenya à élaborer des propositions de projets dans les secteurs de la foresterie, la croissance verte et l'agroforesterie, qui permettront de faire progresser la transition du pays vers une économie verte. Il contribuera en outre à ren-forcer les capacités des principales parties prenantes en matière d'élaboration de projets et de mobilisation de financements climatiques, en coordination et en s'appuyant sur d'autres initiatives de préparation au financement climatique au Kenya.
Status	La lettre d'accord a été signée en mai 2016 et le compte bancaire spécial du projet a été ouvert. Une mission de lancement s'est tenue en octobre 2016 et le processus de passation de marchés pour les entreprises pour l'exécution du projet et le renforcement des capacités a été lancé. Le pre-mier décaissement est prévu début 2017.

Titre	**Renforcement de la résilience au changement climatique des projets d'infrastructure transfrontaliers**
Pays	Multinational
Agence d'exécution	BAD – Département du changement climatique et de la croissance verte
Montant alloué par le FCCA	346 600 $ EU
Objectifs principaux	Le projet va permettre d'améliorer les connaissances et les capacités, et de faciliter les partenariats pour des projets d'infrastructure africains qui prennent en compte le changement climatique. En outre, il contribuera à intégrer la résilience au chan-gement climatique dans deux projets d'infrastructure transfrontaliers, à savoir la section Togo-Bénin du projet d'infrastructure du corridor routier côtier Abidjan-Lagos et le projet hydroélectrique de la Gorge de Batoka en Zambie et Zimbabwe
Status	Le comité technique du FCCA a approuvé le projet en mai 2016. Un atelier de formation sur l'intégration de la résilience climatique dans les projets d'infrastructure pour la région SADC s'est tenu les 6 et 7 décembre 2016 à Lusa-ka, en Zambie. Une ébauche de proposition sur les mesures climatiques à intégrer dans la conception du projet hydroélectrique de la Gorge de Batoka a été achevée et est en cours d'examen. Un montant de 77 314 $ EU (22 % du montant du pro-jet) a été décaissé.

Titre	**Renforcement de la préparation au financement climatique**
Pays	Côte d'Ivoire
Agence d'exécution	Ministère de l'Environnement et du Développement durable
Montant alloué par le FCCA	429 422 $ EU
Objectifs principaux	Le projet contribuera à renforcer la capacité du pays à mobiliser des ressources internationales pour un développement résilient au changement climatique. Il va en particulier élaborer une proposition de projet à soumettre au Fonds d'adaptation et une note conceptuelle détaillée pour le Fonds vert pour le climat. De plus, il as-surera la formation des experts en changement climatique du gouvernement en matière de conception et de gestion de projets et de mobilisation de ressources pour la finance climatique. Enfin, le projet appuiera l'élaboration d'une étude vi-sant à explorer les options d'une accréditation du FVC pour une institution natio-nale.
Status	Le comité technique du FCCA a approuvé le projet en mai 2016. La lettre d'accord a été signée en décembre 2016. Une mission de lancement de projet aura lieu début 2017.



Fonds pour les changements climatiques en Afrique

La Banque Africaine de Développement
Immeuble du Centre de Commerce International d'Abidjan CCIA
Avenue Jean-Paul II
01 BP 1387
Abidjan 01, Côte d'Ivoire
www.afdb.org

Coordination du FFCA à la BAD :
L'équipe de coordination de BAD-FCCA est rattachée au département du changement climatique et de la croissance verte (PECG)

Coordinatrice FCCA :
Louise Brown,
l.brown@afdb.org



2016

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

AFRICA CLIMATE CHANGE FUND
